



„PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS LIETUVOS AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO TINKLUOSE“

Nr. LIFE13 BIO/LT/001303

www.birds-electrogrid.lt

Parengė: projekto vadovė J. Liaudanskytė
projekto asistentas L. Raudonikis

2016-07-14, Vilnius

PROJEKTO TERITORIJA: Lietuva, visi regionai

PROJEKTO TRUKMĖ: 2014-06-01 - 2018-07-31

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

Pagrindinis partneris:

Lietuvos ornitologų draugija;

Susijęs partneris:

AB „LITGRID“

PROJEKTO BIUDŽETAS: ~ 1,5 mln. Eur

PROJEKTĄ FINANSUOJA:

ES – 50%

LR Aplinkos ministerija – 24,34 %

Projekto partneriai – 25,66 %

Projekto tikslai:

- Pagerinti migruojančių, žiemojančių ir kai kurių perinčių paukščių rūšių išsaugojimo sąlygas, sumažinant aukštos įtampos elektros energijos tiekimo linijų keliamą neigiamą poveikį jų populiacijoms;
- Palaikyti pelėsakalių ir kitų sakalų rūšių perinčias populiacijas, įgyvendinant specialias, pagalbines apsaugos priemones.

Projekto uždaviniai:

- Sumažinti paukščių žūčių atvejus jų koncentracijos vietose, kuri lemia paukščių susidūrimas su laidais, virš aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų laidų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
- Sumažinti baltųjų gandrų žūčių lygį dėl elektros įtampos, ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
- Sustabdyti sakalų (ypač pelėsakalių (*Falco tinnunculus*)) perėjimo sąlygų blogėjimą ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje, iškeliant 500 inkilų;
- Įvertinti praktinių apsaugos veiksmų efektyvumą paukščiams, vykdant pritaikytas, išsamias stebėsenos programas;
- Gerinti visuomenės informuotumą apie paukščių žūčių problemą, kurią kelia aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų linijos.

Projektų įgyvendinamos 22 veiklos.

Projekto veiklų struktūra:

- 3 parengiamosios projekto veiklos, kurių rezultatai naudojami įgyvendinant praktines apsaugos veiklas: A.1-A.3;
- 4 praktinės apsaugos veiklos: C.1-C.4;
- 2 projekto veiklų ir poveikio stebėsenos veiklos: D.1-D.2;
- 8 visuomenės informavimo ir informacijos sklaidos veiklos: E.1-E.8;
- 5 projekto administravimo ir projekto pažangos stebėsenos veiklos: F.1-F.5.

A.1 IŠSAMUS LAIDŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ IR PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT NAUDOJAMŲ AUKŠTOS ĮTAMPOS PERDAVIMO TINKLŲ ATRAMŲ LIETUVOJE PARUOŠIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla įgyvendinta	2014 III	2015 I	A.1 veiklos ataskaita „Laidų ženklavimo ir paukščių apsaugos priemonių parinkimas“	Parengta ataskaita apie parinktas priemones, skirtas laidų ženklavimui ir paukščių apsaugai

- Ataskaita patvirtinta projekto stebėsenos komiteto posėdyje, vykusiame 2015-06-18.

A.2 PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT NAUDOJAMŲ AUKŠTOS ĮTAMPOS PERDAVIMO TINKLŲ ATRAMŲ LIETUVOJE SCHEMŲ SUDARYMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID LOD	Veikla įgyvendinta	2014 III	2015 I	A.2 veiklos ataskaita „Paukščių apsaugos priemonių įgyvendinimo projekto parengimas“	Parengta ataskaita bei sudaryta nacionalinio lygmens aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentų schema apie parinktas baltųjų gandrų apsaugos priemonių diegimo vietas.

- Ataskaita patvirtinta projekto stebėsenos komiteto posėdyje, vykusiame 2015-06-18.

A.3 SCHEMAS, KURIOJE NUSTATOMOS SAKALAMS SKIRTŲ INKILŲ ĮRENGIMO VIETOS LIETUVOJE, SUDARYMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla įgyvendinta	2014 II	2015 I	A.3 veiklos ataskaita „Sakalams skirtų inkilų įrengimo programos parengimas“	Parengta ataskaita ir sudaryta schema, kurioje nustatomos sakalams skirtų inkilų įrengimo vietos Lietuvoje

- Ataskaita patvirtinta projekto stebėsenos komiteto posėdyje, vykusiame 2015-06-18.

C.1 LAIDŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS SVARBIOSE PAUKŠČIŲ APSISTOJIMO VIETOSE

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 I	-	Turi būti įrengtos 7100 „spiralinio“ tipo paukščiams pavojingų aukštos įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo priemonės 80 km aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose




- Iki 2016 m. birželio 30 d. ant laidų iškabintos 2208 „spiralės“ tipo žymekliai 8-iose numatytose projekto vietose.
- Darbai vykdomi pagal AB LITGRID sudarytą paslaugų sutarčių įgyvendinimo planą.

C.2 PADIDINTO MATOMUMO ŽYMEKLIŲ DIEGIMAS LABIAUSIAI PAUKŠČIAMS PAVOJINGOSE VIETOSE

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 I	-	Turi būti įrengtos 1500 „pakabukų“ tipo paukščiams ypatingai pavojingų aukštos įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo priemonės 28 km aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose

- Iki 2016 m. birželio 30 d. ant laidų iškabinta 1676 „pakabuko“ tipo žymekliai 7-iose projekto vietose.
- Darbai vykdomi pagal AB LITGRID sudarytą paslaugų sutarčių įgyvendinimo planą.

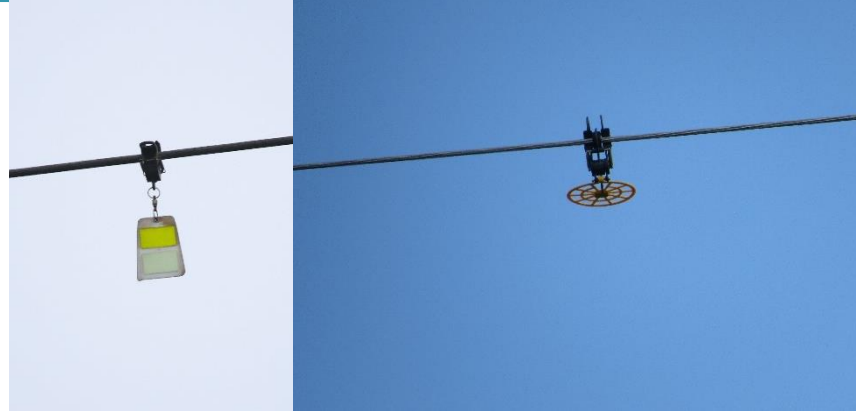


C.1 IR C.2 LAIDŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS SVARBIOSE IR PAVOJINGOSE PAUKŠČIU APSISTOJIMO VIETOSE




C.3 PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT ATRAMŲ ĮRENGIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 I	-	Aukštos įtampos perdavimo linijų atramose turi būti įrengtos mažiausiai 1200 lėkštučių (6000 vnt.) ir šakučių (6000 vnt.) gandrų apsaugos priemonės.

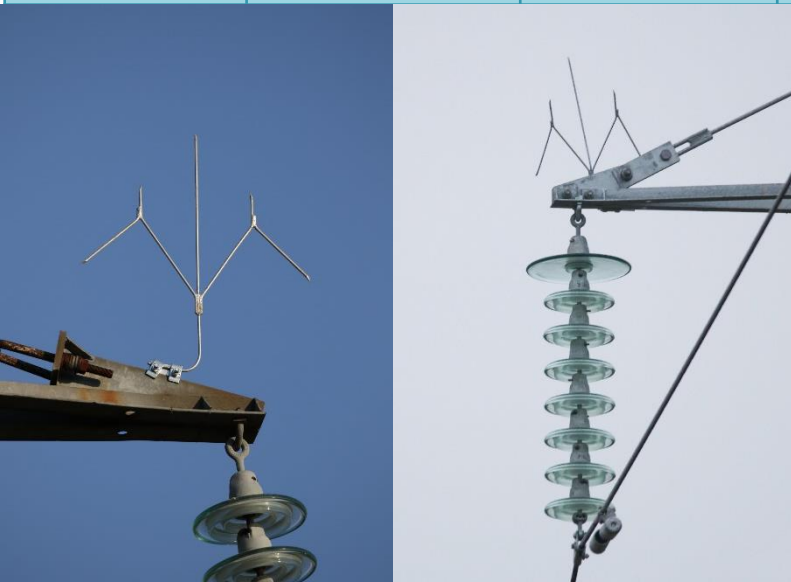

- Iki 2016 m. birželio 30 d. ant stulpų įrengtos 5192 „šakutės“ ir 3604 „lėkštelės“ tipo apsaugos: viso ant 1584 atramų.
- Darbai vykdomi pagal AB LITGRID sudarytą paslaugų sutarčių įgyvendinimo planą.

C.3 PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT ATRAMŲ ĮRENGIMAS

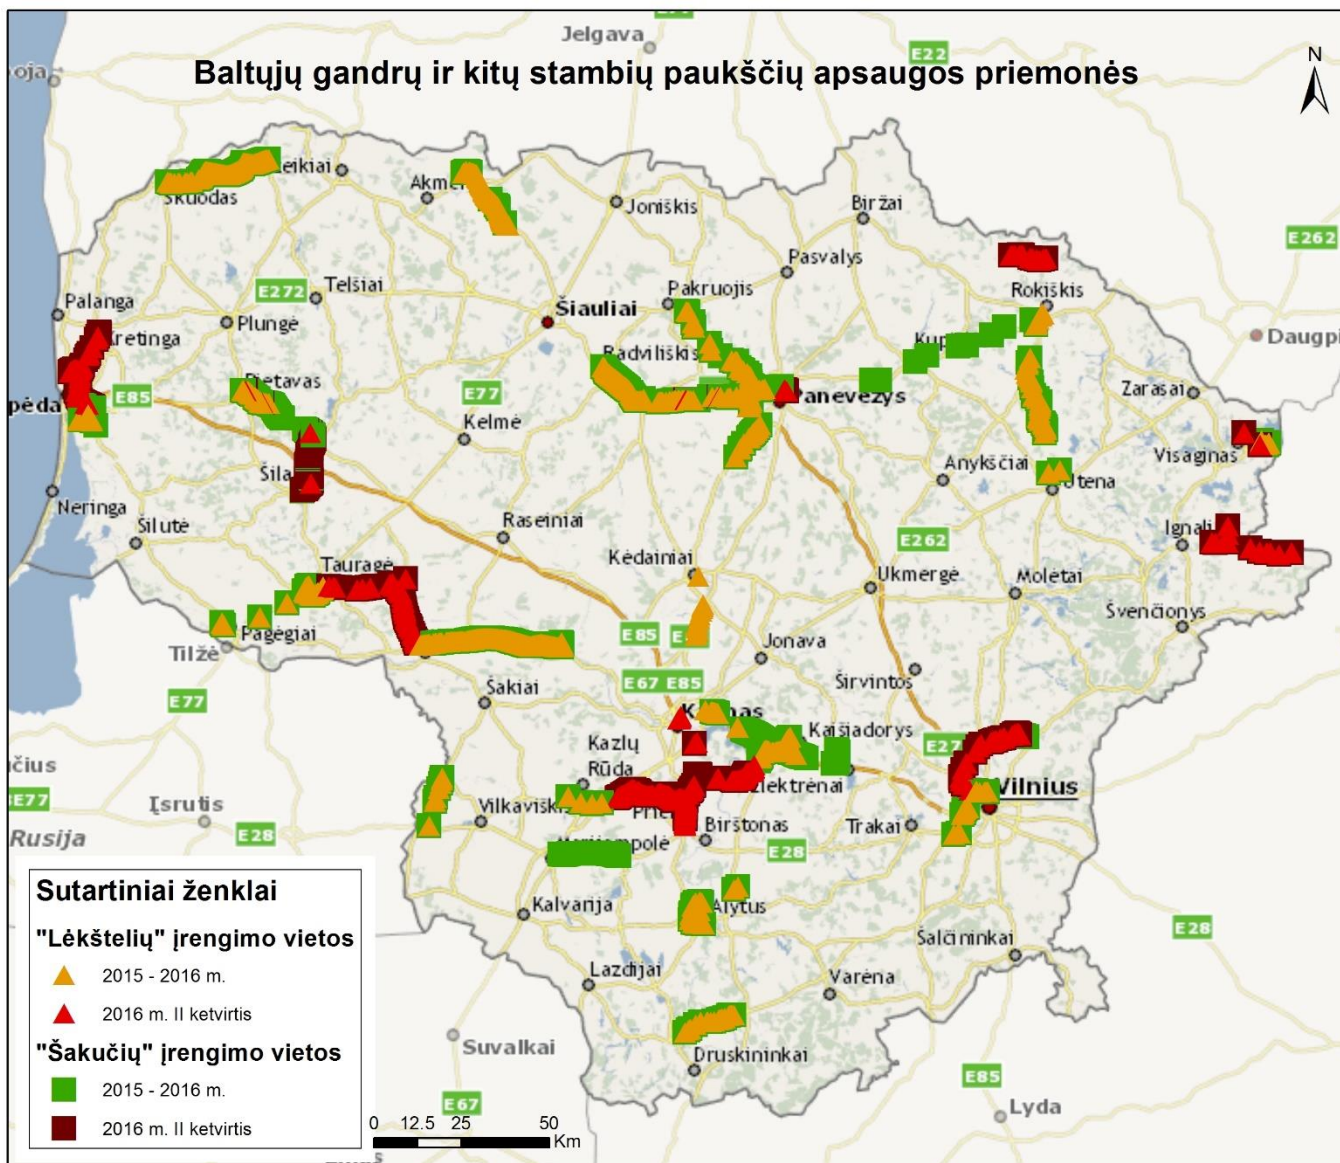


C.4 SAKALAMS SKIRTŲ INKILŲ IŠKĖLIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID LOD	Veikla vykdoma	2014 IV	2017 I	-	Pagaminta ir ant aukštos įtampos perdavimo linijų atramų turi būti įrengta 500 vnt. dirbtinių lizdavičių/inkilų pelėsakaliams.

- Iki 2016 m. birželio 30 d. ant atramų iškelti 360 inkilų.
- Iki 2015 08 mėn. pagaminti visi 500 inkilų
- Darbai vykdomi pagal AB LITGRID sudarytą paslaugų sutarčių įgyvendinimo planą, neįymiai „lenkiant“ darbų grafiką.



C. 4 SAKALAMS SKIRTU INKILU IŠKĒLIMAS

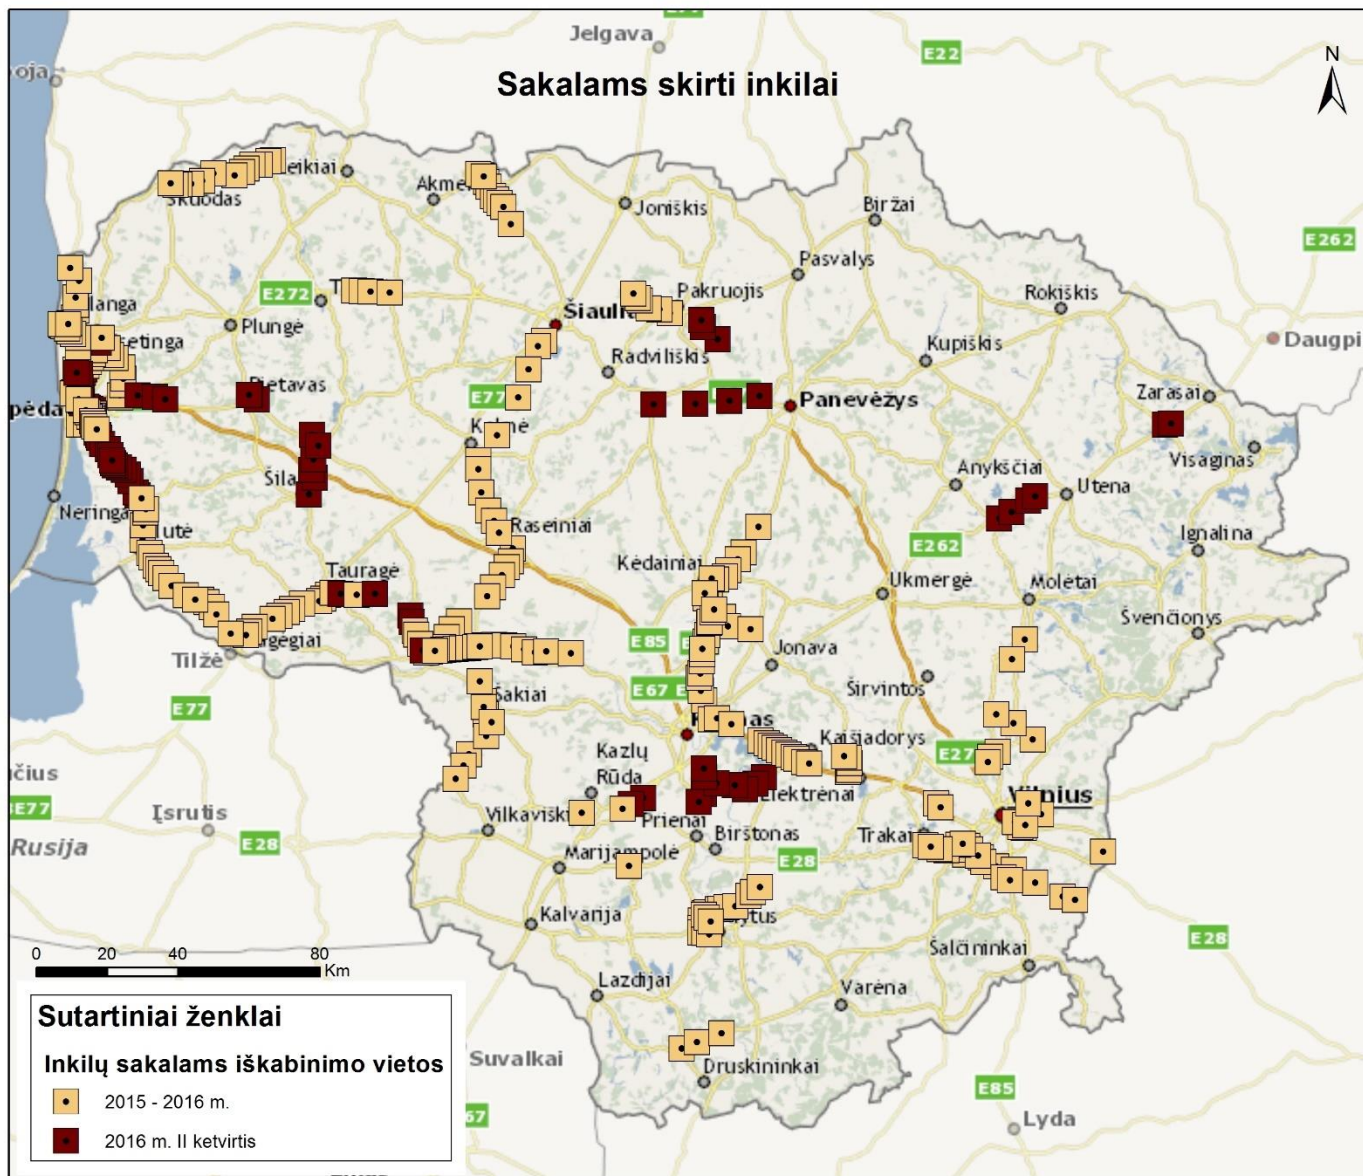

D.1 PROJEKTO VEIKLŲ STEBĖSENA

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 II	Turi būti parengtos 4 (kasmetinės) projekto pažangos stebėsenos ataskaitos.	-

- I-oji ataskaita buvo parengta ir pristatyta bei patvirtinta projekto stebėsenos komiteto posėdyje, vykusiame 2015-06-18.

D.2 EX-ANTE IR EX-POST PROJEKTO APSAUGOS VEIKLŲ VEIKSMINGUMO STEBĖSENA

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2018 II	Parengtas Ex-ante ir ex-post stebėsenos planas; Turi būti parengtos 4 (kasmetinės) projekto Ex-ante ir ex-post stebėsenos ataskaitos.	Parengtas Ex-ante ir ex-post stebėsenos planas; Turi būti pasirinkti Ex-ante stebėsenos rodikliai.

- I-oji ir II-oji (bendra) ataskaita parengta, bus pristatyta sekančiais pranešimais. Ji turi būti patvirtina projekto stebėsenos komiteto posėdyje.
- Sukurta projekte nenumatyta iškeltų inkilų stebėsenos duomenų bazė.



E.1 INFORMACINIŲ STENDŲ ĮRENGIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2015 II	2017 IV	Turi būti parengta informacinė medžiaga 18-ai stendų.	Iki 2016-05-31 turi būti įrengti 9 informaciniai stendai; Iki 2017-10-31 turi būti įrengti visi 18 informacinių stendų.

- Parengtas informacinių stendų techninis projektas; vyksta stendų įrengimo vietų atranka.
- Pradėtas informacinės medžiagos parengimo, dizaino ir spaudos viešasis pirkimas.

E.1 INFORMACINIŲ STENDŲ ĮRENGIMAS

INFORMACINIS STENDAS IS-1

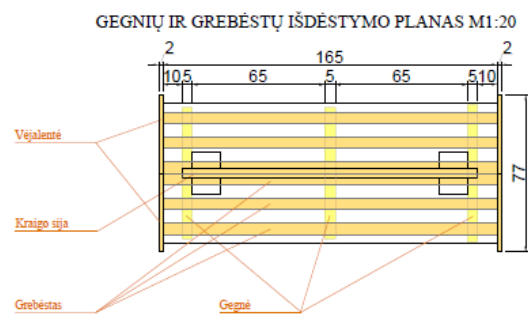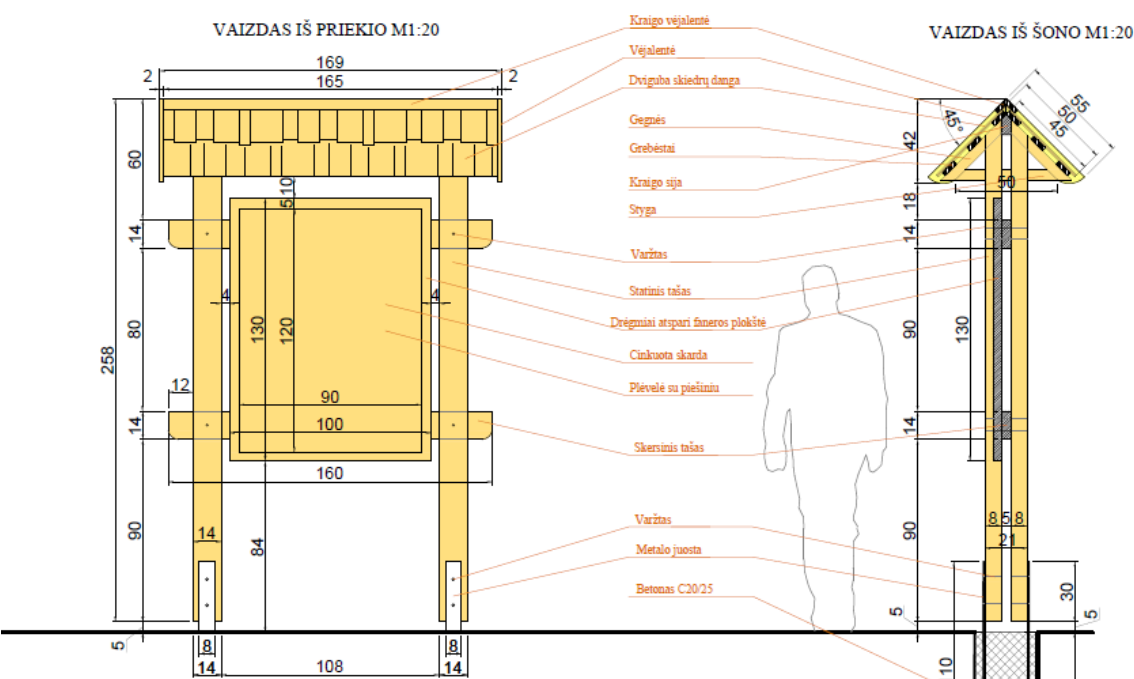

- STENDO IS-1 KIEKIAI:**
1. Statinis tašas 14x8cm, L=250cm, 4vnt., 0.112m³
 2. Skersinis tašas 14x5cm, L=160cm, 2vnt., 0.022m³
 3. Varžtas L=21cm, 4vnt.
 4. Drėgniai atspari faneros plokštė 100x130cm, 1vnt., 1.3m²
 5. Cinkuota skarda 90x120cm, 1vnt., 1.08m²
 6. Plėvelė su piešiniu 90x120cm, 1vnt., 1.08m²
- Stogas:**
7. Gegnės 5x5cm, L=45cm, 6vnt., 0.007m³
 8. Grebėstai 2x8cm, L=165cm, 6vnt., 0.016m³
 9. Kraigo siją 5x10cm, L=145cm, 1vnt., 0.007m³
 10. Styga 5x5cm, L=50cm, 2vnt., 0.003m³
 11. Kraigo vėjalentė 2x8cm, L=165cm, 2vnt., 0.005m³
 12. Vėjalentė 2x10cm, L=55cm, 4vnt., 0.004m³
 13. Dviguba skiedrų danga (skiedra 50x10x0.7cm) 165x100cm, 1.65m²
- Pamatas:**
14. Betonas C12/15, H=80cm, d=30cm, 2vnt., 0.113m³
 15. Metalu juosta 80x5mm, L=110cm, 4vnt., 13.82kg
 16. Varžtas, L=8cm, 8vnt.

- Pastabos**
1. Stendo stovai gaminami iš dvipusio pjovimo rąstų, tvirtinami įbetonuotomis metalu juostomis;
 2. Stogas dengiamas dviguba skiedrų danga;
 3. Stogo konstrukcijos elementai tarpusavyje jungiami įkirtimais, tvirtinami vinimis ir kabėmis;
 4. Visa naudojama mediena antiseptinama ir dažoma;
 5. Varžtų skyklės užkifamos mediniais kaisčiais;
 6. Stendas atliekamas tautodailininkų, iki 50% konstrukcijų paviršiaus padengiama raizginiais ir pjautiniais.
 7. Nesilpninant konstrukcijų, gali būti pakitimai;
 8. Matmenys pateikti centimetrais;
 9. Konstrukcinių medinių elementų matmenys gali būti koreguojami projekto autoriaus;
 10. Stendo informacinę dalį makuotuoja rangovas.

ATESTATO NR.	ANDRIAUS DIRSĖS INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMOJIS Nr. 023523				LAUKO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INFRASTRUKTŪROS ELEMENTAI LANKYTOJAMS MARIAMPOLĖS, DRUSKININKŲ, LAZDYJŲ RAJ. SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS		
AL Nr. A 1522	PV	A. DIRSĖ		2016	INFORMACINIS STENDAS IS-1		LAIŲA
AL Nr. A 1522	Arch.	A. DIRSĖ		2016			O
ETAPAS	UŽSAKOVAS: LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJA				PR-16/03-BR-00		
SP						LAPAS	LAPŲ
						1	1

E.2 FILMO APIE PAUKŠČIŲ ŽŪTIES ANT AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ PROBLEMĄ SUKŪRIMAS IR TRANSLIAVIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2015 I	2016 IV	Kuriamas 15 min. trukmės filmas LT kalba su EN subtitrais, turi būti išleista ir išplatinta 600 egz. filmo DVD.	Sukurtas filmas turi būti ištransliuotas nacionalinių TV kanalų populiariu laiku mažiausiais 5 kartus.

- Filmo scenarijus suderintas su filmo kūrėjais;
- Baigtas veiklų filmavimas. Iki 2016.08 tęsis saugomų paukščių filmavimas;
- Iki 2016.11 bus atliktas filmo montavimas;
- Iki 2016 m. pabaigos išleistos filmo DVD kopijos;
- Iki 2017 m. kovo pab. filmo transliacija.
- 2016 m. buvo vykdoma tiesioginė transliacija iš Klaipėdos universiteto teritorijoje esančio pelėsakalių inkilo, 2017 m. – planuojama transliacija iš inkilo, iškelto ant elektros perdavimo atramos.

E.3 TARPTAUTINIO SEMINARO APIE PAUKŠČIŲMIRTINGUMO MAŽINIMĄ DĖL ATSTITREKIMŲ Į AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS PERDAVIMO LINIJAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2016 III	2017 I	Turi būti parengta ir atspausdinta dalomoji medžiaga seminarui.	Turi būti suorganizuotas vienos dienos tarptautinis seminaras, kurio dalyvių skaičius – apie 50.

- Preliminari seminaro data 2017 m. kovo mėn.

E.4 PROJEKTO INTERNETO SVETAINĖS SUKŪRIMAS IR PALAIKYMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2018 III		Sukurta ir nuolat atnaujinama aktuali informacija projekto interneto svetainė: http://www.birds-electrogrid.lt/ .

- Svetainė viešai pasiekiami nuo 2014 m. 11 mėn.;
- Informacija svetainėje nuolat atnaujinama lietuvių ir anglų k.;
- Projekto ataskaitos ir leidiniai talpinami svetainėje;
- Projekto svetainės vidutinis lankomumas – 327 lankytojai/mėn.

E.5 PROJEKTO VIEŠINIMAS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Atlikta:</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2018 III	• Daugiau nei 15 straipsnių apie projektą publikuotų interneto svetainėse; • Daugiau nei 6 straipsniai apie projektą ir vykdomas veiklas išspausdinti gamtiniuose žurnaluose; • Daugiau nei 10 naujienų apie projektą paskelbtų LOD facebook grupėje; • Parengtas 1 radijo reportažas apie projekto veiklas.

E.6 PROJEKTO INFORMACINĖS MEDŽIAGOS APIE SPRENDŽIAMĄ PROBLEMĄ PARENGIMAS IR LEIDYBA

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2017 IV	Parengta, išleista ir išplatinta: - projekto lankstinukas (1000 egz.); 4 (kasmetiniai) sieniniai kalendoriai (po 500 egz, kiekvieno); - leidinys-brošiūra vaikams (750 egz.) apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą; - leidinys visuomenei apie projektu sprendžiamas problemas, sprendimo būdus LT ir EN kalbomis (800 egz.).	-

E. 6 PROJEKTO INFORMACINĖS MEDŽIAGOS APIE SPRENDŽIAMĄ PROBLEMĄ PARENGIMAS IR LEIDYBA

- Išleistas ir platinamas projekto lankstukas (1000 egz.)
- Išleisti ir išplatinti 2 sieniniai kalendoriai (2015 ir 2016 m.) po 500 egz. kiekvienas
- Išleista ir platinama brošiūra vaikams apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą (750 egz.)
- Išleistas ir platinamas plakatas apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą (1000 egz.) – paraiškoje nenumatytas, kaštus planuojama padengti iš sutaupytų viešinimo lėšų

E.7 PROJEKTO TECHNINĖS ATASKAITOS PARENGIMAS IR PLATINIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2017 IV	2018 I	Turi būti parengta techninė ataskaita apie projekto patirtį, įgytą diegiant praktines paukščių mirtingumą ant aukštos įtampos elektros linijų mažinančias priemones ir gerinant sakalų perėjimo sąlygas. Ši ataskaita turi būti pateikta gamtosauginėms institucijoms, elektros perdavimo sistemos operatoriams, žiniasklaidai, patalpinta projekto interneto svetainėje.	-

E.8 PROJEKTO “LAYMAN” ATASKAITOS PARENGIMAS IR PLATINIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2018 I	2018 II	Turi būti parengta ir išplatinta populiari projekto ataskaita visuomenei (LT ir EN kalbomis, 700 egz.) apie vykdytą projektą, pasiektus rezultatus ir įgytą patirtį.	-

F.1 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LOD)

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 II	2018 III	-	- Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27); - Įdarbintas personalas projekto veiklų vykdymui; - Parengta ir pateikta EK projekto pradinė ataskaita (2015-02-28); Turi būti parengtos ir pateiktos: - projekto tarpinė ataskaita; - projekto pažangos ataskaita; - projekto galutinė ataskaita. Turi būti suorganizuoti 5 projekto stebėsenos komiteto posėdžiai.

F. 1 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LOD)

- Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27);
- Įdarbintas personalas projekto veiklų vykdymui (projekto koordinatorė Justina Liaudanskytė, projekto asistentas Liutauras Raudonikis, biologinės įvairovės ekspertas Julius Morkūnas, GIS ekspertė Vita Monkuvienė, svetainės administravimo ekspertas Gintaras Riauba, 2 ornitologai – Marius Karlonas ir Eglė Pakšytė);
- Parengta ir pateikta EK (vėliau EK patvirtinta) projekto įvadinė ataskaita (2015 03 mėn.);
- Vidurio pažangos ataskaitos parengimas ir pateikimas EK numatomas 2016 08 mėn.;
- Suorganizuoti projekto stebėsenos komiteto posėdžiai: 2015-06-18 ir 2016-07-14.

F.2 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LITGRID)

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 III	2018 III	-	- Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27); - Priskirtas personalas projekto veiklų vykdymui.

F.3 “AFTER-LIFE” KOMUNIKACIJOS PLANO PARENGIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2018 III	2018 III	Turi būti parengtas After-LIFE komunikacijos planas ir pateiktas su galutine projekto ataskaita.	-

F.4 KOMUNIKAVIMAS SU KITAIS PROJEKTAIS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Atlikta</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 II	2018 III	Su LIFE+ projektus vykdančiomis organizacijomis patirties mainų tikslu suorganizuoti daugiau nei 2 susitikimai.

- 2015-04-15 d. LOD organizavo tarptautinį seminarą su tarptautinių ES šalių projektu „BESTGRID“ apie draugišką aplinkai praktiką plėtojant elektros linijų perdavimo tinklą;
- 2015 m. lapkričio 18 d. du projekto komandos nariai dalyvavo 6-je tarptautinėje konferencijoje „Birds and wires“, kuri vyko Budapešte, Vengrijoje. Konferencijoje skaitytas pranešimas apie vykdomą LIFE projektą Lietuvoje.

F.5 PROJEKTO AUDITAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2015 I	2018 III	Sudaryta paslaugų sutartis dėl projekto audito paslaugų. Turi būti atlikti 4 tarpiniai projekto auditai ir galutinis projekto auditas.	-

- 2015 m. 10 mėn. atliktas I-asis tarpinis auditas;
- 2016 m. 10 mėn. numatomas II-as tarpinis auditas.
