



„PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS LIETUVOS AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO TINKLUOSE“

Nr. LIFE13 BIO/LT/001303

www.birds-electrogrid.lt

Parengė: projekto vadovė J. Liaudanskytė
projekto asistentas L. Raudonikis

2017-11-15, Vilnius

PROJEKTO TERITORIJA: Lietuva, visi regionai

PROJEKTO TRUKMĖ: 2014-06-01 - 2018-07-31

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

Pagrindinis partneris:

Lietuvos ornitologų draugija;

Susijęs partneris:

AB „LITGRID“

PROJEKTO BIUDŽETAS: ~ 1,5 mln. Eur

PROJEKTĄ FINANSUOJA:

ES – 50%

LR Aplinkos ministerija – 24,34 %

Projekto partneriai – 25,66 %

Projekto tikslai:

- Pagerinti migruojančių, žiemojančių ir kai kurių perinčių paukščių rūšių išsaugojimo sąlygas, sumažinant aukštos įtampos elektros energijos tiekimo linijų keliamą neigiamą poveikį jų populiacijoms;
- Palaikyti pelėsakalių ir kitų sakalų rūšių perinčias populiacijas, įgyvendinant specialias, pagalbines apsaugos priemones.

Projekto uždaviniai:

- Sumažinti paukščių žūčių atvejus jų koncentracijos vietose, kurį lemia paukščių susidūrimas su laidais, virš aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų laidų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
- Sumažinti baltųjų gandrų žūčių lygį dėl elektros įtampos, ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
- Sustabdyti sakalų (ypač pelėsakalių (*Falco tinnunculus*)) perėjimo sąlygų blogėjimą ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje, iškeliant 500 inkilų;
- Įvertinti praktinių apsaugos veiksmų efektyvumą paukščiams, vykdant pritaikytas, išsamias stebėsenos programas;
- Gerinti visuomenės informuotumą apie paukščių žūčių problemą, kurią kelia aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų linijos.

Projektu įgyvendinamos 22 veiklos.

Projekto veiklų struktūra:

- 3 parengiamosios projekto veiklos, kurių rezultatai naudojami įgyvendinant praktines apsaugos veiklas: A.1-A.3;
- 4 praktinės apsaugos veiklos: C.1-C.4;
- 2 projekto veiklų ir poveikio stebėsenos veiklos: D.1-D.2;
- 8 visuomenės informavimo ir informacijos sklaidos veiklos: E.1-E.8;
- 5 projekto administravimo ir plėtros veiklos: F.1-F.5.

A.1 IŠSAMUS LAIDŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ IR PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT NAUDOJAMŲ AUKŠTOS ĮTAMPOS PERDAVIMO TINKLŲ ATRAMŲ LIETUVOJE PARUOŠIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2015 I	2014 III	2015 I	A.1 veiklos ataskaita „Laidų ženklavimo ir paukščių apsaugos priemonių parinkimas“	Parengta ataskaita apie parinktas priemones, skirtas laidų ženklavimui ir paukščių apsaugai

Ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje

A.2 PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT NAUDOJAMŲ AUKŠTOS ĮTAMPOS PERDAVIMO TINKLŲ ATRAMŲ LIETUVOJE SCHEMŲ SUDARYMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID LOD	Veikla pabaigta 2015 I	2014 III	2015 I	A.2 veiklos ataskaita „Paukščių apsaugos priemonių įgyvendinimo projekto parengimas“	Parengta ataskaita bei sudaryta nacionalinio lygmens aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentų schema apie parinktas baltųjų gandrų apsaugos priemonių diegimo vietas.

Ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje

A.3 SCHEMAS, KURIOJE NUSTATOMOS SAKALAMS SKIRTŲ INKILŲ ĮRENGIMO VIETOS LIETUVOJE, SUDARYMAS


<i>Veiklą igyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2015 I	2014 II	2015 I	A.3 veiklos ataskaita „Sakalams skirtų inkilų įrengimo programos parengimas“	Parengta ataskaita ir sudaryta schema, kurioje nustatomos sakalams skirtų inkilų įrengimo vietos Lietuvoje

Ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje

Klausimas PPK ar reikia formaliai ją papildyti, jei planuojama iškelti daugiau (papildomai) inkilų?

C.1 LAIDŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS SVARBIOSE PAUKŠČIŲ APSISTOJIMO VIETOSE

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 I	-	Turi būti įrengtos 7100 „spiralinio“ tipo paukščiams pavojingų aukštos įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo priemonės 80 km aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose

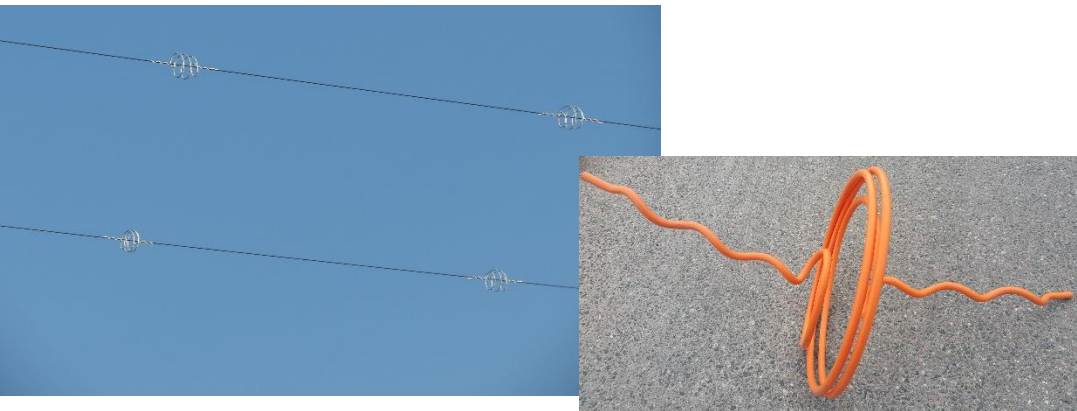

Iki 2016 m. IV ketv. (imtina) ant laidų iškabintos 5149 „spiralės“ 18-oje numatytų projekto vietų.
Iki 2017 m. III ketv. (imtina) – 5553 „spiralių“.

C.2 PADIDINTO MATOMUMO ŽYMEKLIŲ DIEGIMAS LABIAUSIAI PAUKŠČIAMS PAVOJINGOSE VIETOSE


Veiklą įgyvendina	Veiklos vykdymo pažanga	Pradžia (aktuali)	Numatyta pabaiga	Pasiekti rezultatai (kūriniai)	Pasiekimai
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 I	-	Turi būti įrengtos 1500 „pakabukų“ tipo paukščiams ypatingai pavojingų aukštos įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo priemonės 28 km aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose

Iki 2016 m. IV ketv. (imtina) ant laidų iškabinti 2217 specialūs „pakabukai“ 14-oje projekto vietų.
Iki 2017 m. III ketv. (imtina) – 2624 „pakabukų“.



C. 1 IR C. 2 LAIDŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS SVARBIOSE IR PAVOJINGOSE PAUKŠČIŲ APSISTOJIMO VIETOSE

Laidų matomumą gerinančių priemonių įdiegimo vietos

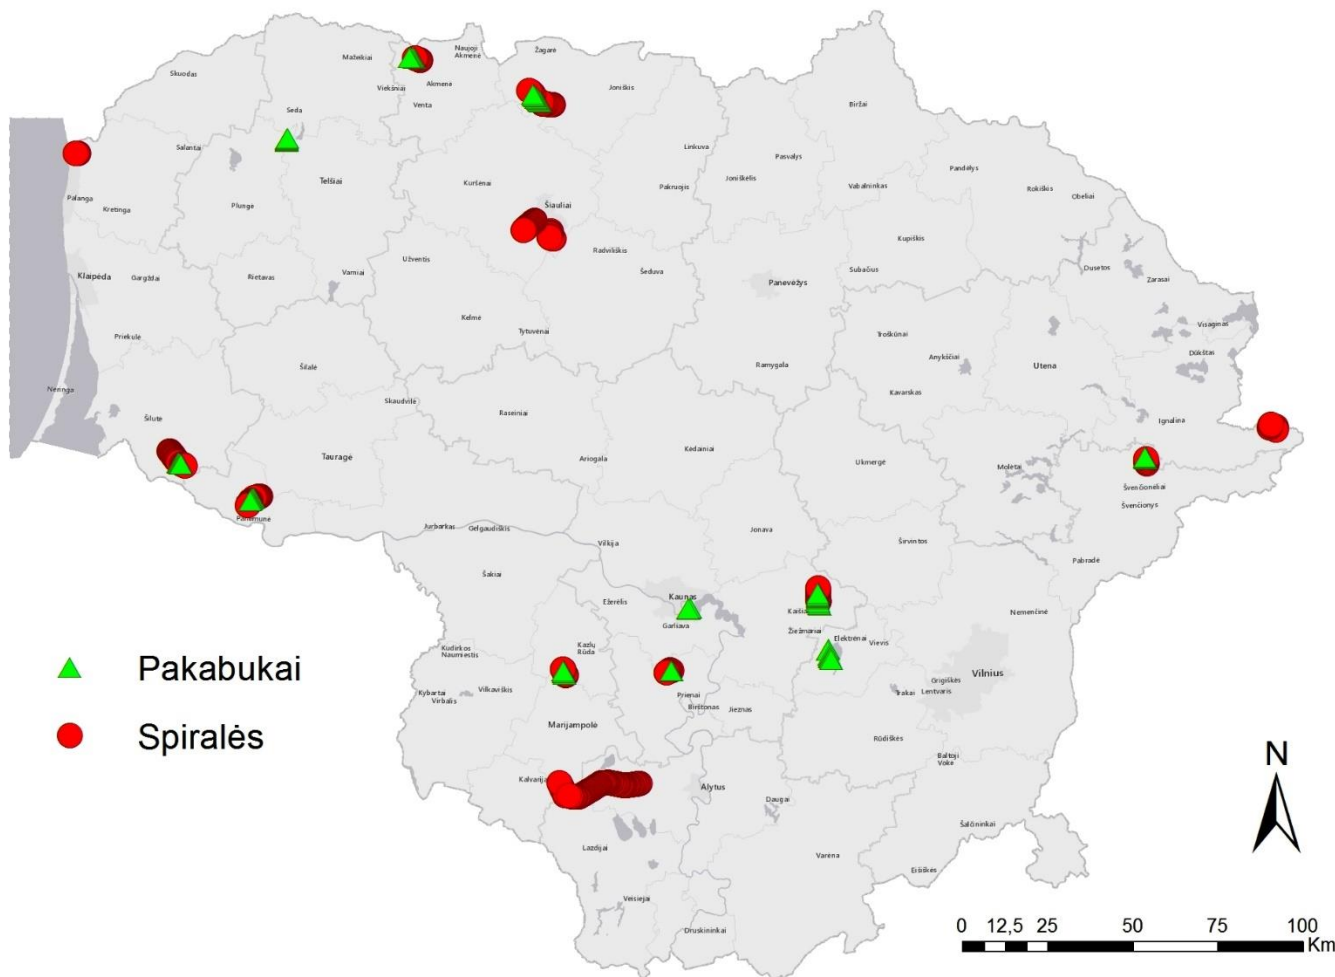

C.3 PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT ATRAMŲ ĮRENGIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 I	-	Ant mažiausiai 1200 aukštos įtampos perdavimo linijų atramų turi būti įrengtos lėkštučių (6000 vnt.) ir šakučių (6000 vnt.) gandrų apsaugos priemonės.



Iki 2016 m. IV ketv. (imtina) ant stulpų įrengtos 6029 „šakutės“ ir 3613 „lėkštelės“ tipo apsaugos.
Iki 2017 m. III ketv. (imtina) ant stulpų įrengtos 9121 „šakutės“ ir 5871 „lėkštelės“ tipo apsaugos.

C. 4 SAKALAMS SKIRTŲ INKILŲ IŠKĖLIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID LOD	Veikla vykdoma	2014 IV	2017 I	-	Pagaminta ir ant aukštos įtampos perdavimo linijų atramų turi būti įrengta 500 vnt. dirbtinių lizdaviėčių/inkilų pelėsakaliams.


Iki 2016 m. IV ketv. (imtina) ant stulpų iškelti 418 inkilai.
Iki 2015 08 mėn. pagaminti visi 500 inkilų.

Iki 2017 m. III ketv. (imtina) ant stulpų iškelti visi, kaip suplanuota, 500 inkilų.



C.4 SAKALAMS SKIRTŲ INKILŲ IŠKĖLIMAS

Sakalams skirtų inkilų iškėlimo vietos

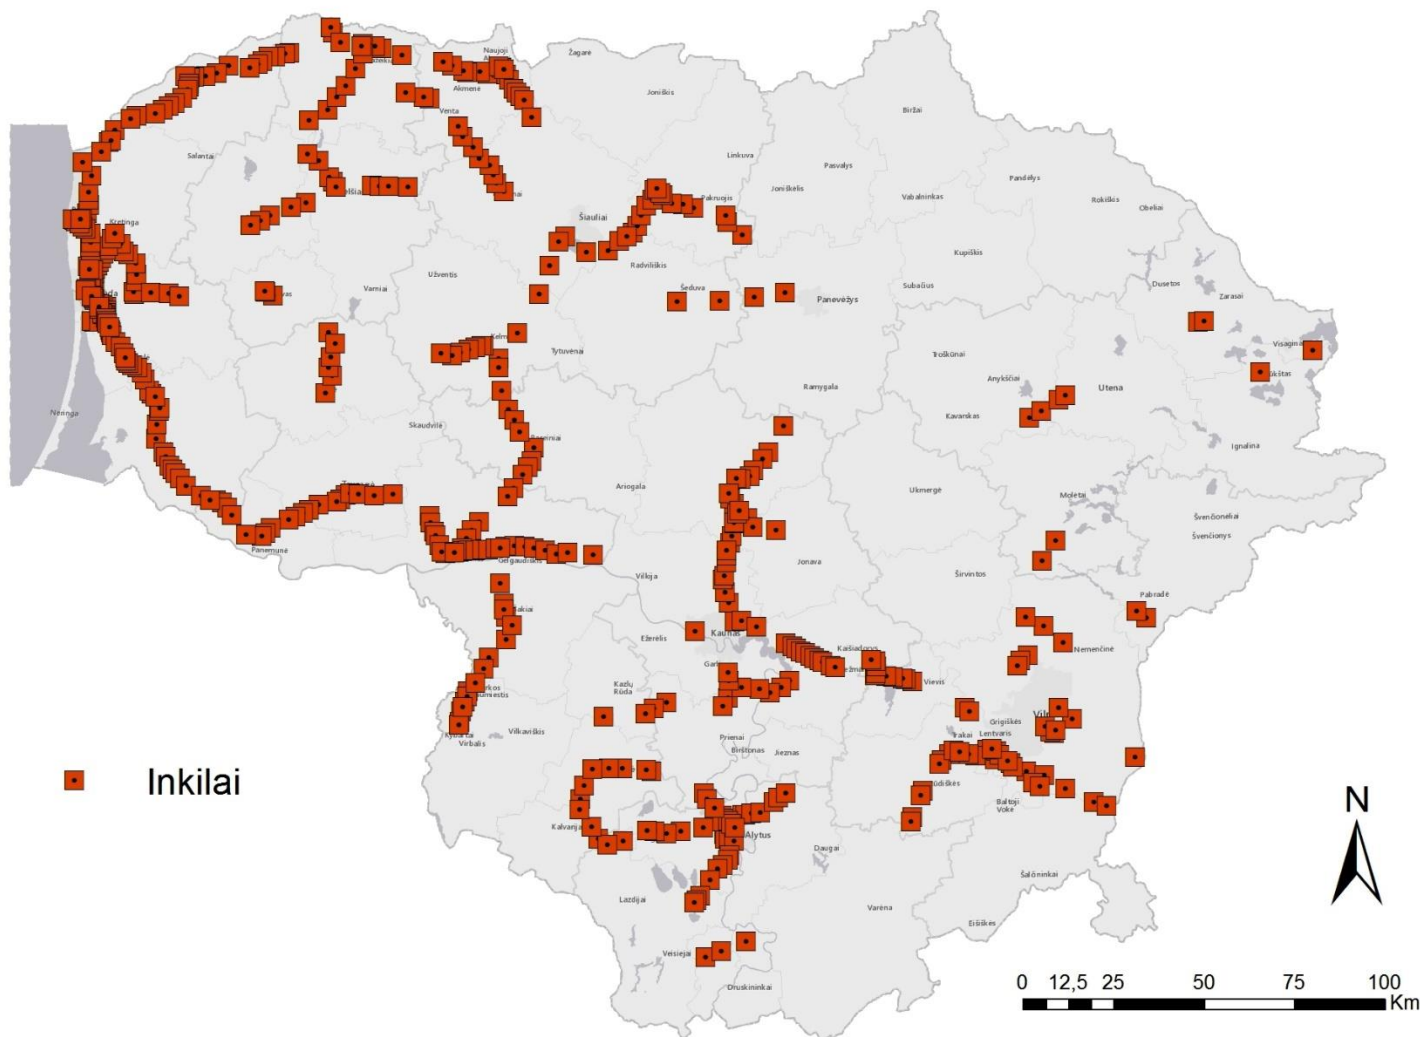

D.1 PROJEKTO VEIKLŲ STEBĖSENA

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 IV	2018 II	Turi būti parengtos 4 (kasmetinės) projekto pažangos stebėsenos ataskaitos.	-

I-oji ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje ir patalpinta projekto svetainėje;

II-oji ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2016-07-14 posėdyje ir patalpinta projekto svetainėje.

D.2 EX-ANTE IR EX-POST PROJEKTO APSAUGOS VEIKLŲ VEIKSMINGUMO STEBĖSENA

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2018 II	Parengtas Ex-ante ir ex-post stebėsenos planas; Turi būti parengtos 4 (kasmetinės) projekto Ex-ante ir ex-post stebėsenos ataskaitos.	Parengtas Ex-ante ir ex-post stebėsenos planas; Turi būti pasirinkti Ex-ante stebėsenos rodikliai.

I-oji ir II-oji (**bendra**) ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2017-07-14 posėdyje ir patalpinta projekto svetainėje.

E.1 INFORMACINIŲ STENDŲ ĮRENGIMAS


<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pradėta	2015 II	2017 IV	Turi būti parengta informacinė medžiaga 18-ai stendų.	Iki 2016-05-31 turi būti įrengti 9 informaciniai stendai; Iki 2017-10-31 turi būti įrengti visi 18 informacinių stendų.

9 vnt. informacinių stendų (2 vnt. – Kaune, 2 vnt. – Elektrėnų sav., Ignalinos r., Švenčionių r., Alytaus r., Kaišiadorių r., Karmėlavos r.) įrengti 2017-04-06.

Likusiųjų 9 vnt. informacinių stendų įrengimo vietos suderintos, pradėtas jų įrengimas, iki 2017-11-30 stendai bus įrengti.




E.1 INFORMACINIŲ STENDŲ ĮRENGIMAS

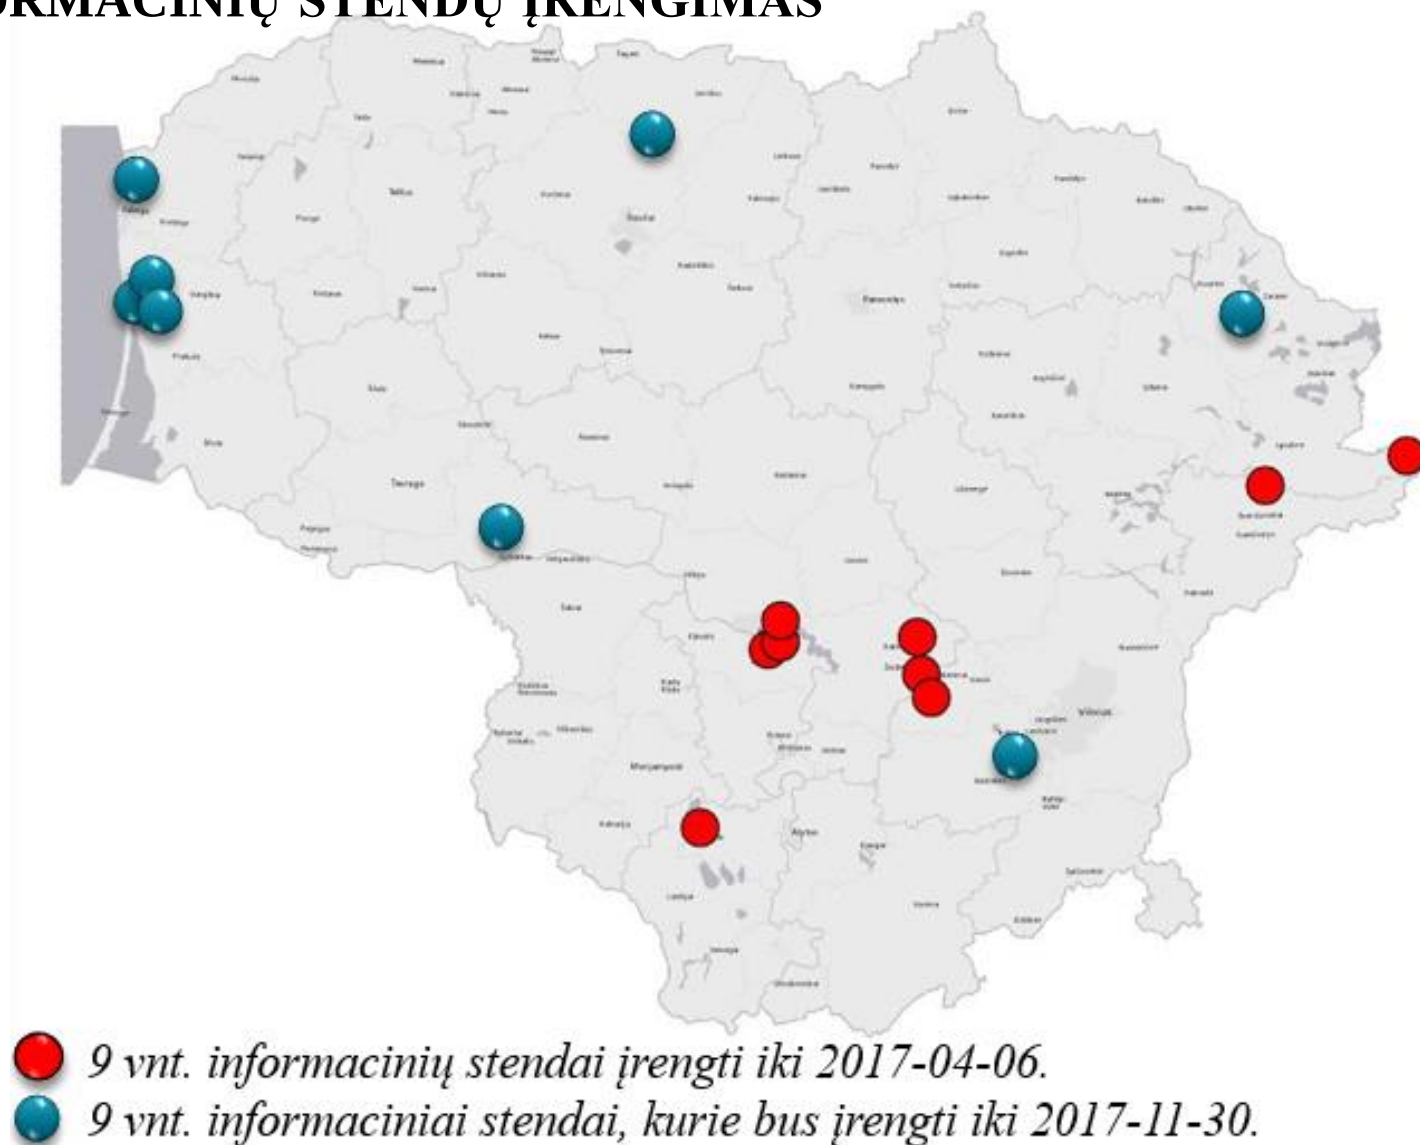

E.2 FILMO APIE PAUKŠČIŲ ŽŪTIES ANT AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ PROBLEMĄ SUKŪRIMAS IR TRANSLIAVIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2015 I	2016 IV	Sukurtas 15 min. trukmės filmas LT kalba su EN subtitrais, turi būti išleista ir išplatinta 600 egz. filmo DVD.	Sukurtas filmas turi būti ištransliuotas nacionalinių TV kanalų populiariu laiku mažiausiai 5 kartus.

2016 m. pab. sukurtas filmas „Skirtingų pasaulių sandūroje“ ir pagaminti DVD, kuris transliuotas:
 - 2017-05-13 LRT Kultūra kanalu.



E.3 TARPTAUTINIO SEMINARO APIE PAUKŠČIŲ MIRTINGUMO MAŽINIMĄ DĖL ATSITRENKIMŲ Į AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS PERDAVIMO LINIJAS

<i>Veiklą įgyvendin a</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2016 III	2017 IV	Turi būti parengta ir atspausdinta dalomoji medžiaga seminarui.	Turi būti suorganizuotas vienos dienos tarptautinis seminaras, kurio dalyvių skaičius – apie 50.

Seminaras numatomas 2018 m. II ketv.

E.4 PROJEKTO INTERNETO SVETAINĖS SUKŪRIMAS IR PALAIKYMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2018 III		Sukurta ir nuolat atnaujinama aktuali informacija projekto interneto svetainė: http://www.birds-electrogrid.lt/ .

- Svetainė viešai pasiekama nuo 2014 m. 11 mėn.;
- Informacija svetainėje nuolat atnaujinama lietuvių ir anglų k.;
- Projekto ataskaitos ir leidiniai talpinami svetainėje;
- Projekto svetainės vidutinis lankomumas – 172 apsilankymai/mėn.

E.5 PROJEKTO VIEŠINIMAS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Atlikta:</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2018 III	• Daugiau nei 30 straipsnių apie projektą publikuotų interneto svetainėse; • Daugiau nei 6 straipsniai apie projektą ir vykdomas veiklas išspausdinti gamtiniuose žurnaluose; • Daugiau nei 10 naujienų apie projektą paskelbtų LOD Facebook grupėje; • Parengtas 1 radijo reportažas apie projekto veiklas. • Parengtas 1 TV reportažas apie projekto veiklas.

E. 6 PROJEKTO INFORMACINĖS MEDŽIAGOS APIE SPRENDŽIAMĄ PROBLEMĄ PARENGIMAS IR LEIDYBA

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 III	2017 IV	Parengta, išleista ir išplatinta: - projekto lankstinukas (1000 egz.); 4 (kasmetiniai) sieniniai kalendoriai (po 500 egz, kiekvieno); - leidinys-brošiūra vaikams (750 egz.) apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą; - leidinys visuomenei apie projektu sprendžiamas problemas, sprendimo būdus LT ir EN kalbomis (800 egz.).	-

E. 6 PROJEKTO INFORMACINĖS MEDŽIAGOS APIE SPRENDŽIAMĄ PROBLEMĄ PARENGIMAS IR LEIDYBA

- Išleistas ir platinamas projekto lankstukas (1000 egz.)
- Išleisti ir išplatinti 3 sieniniai kalendoriai (2015, 2016 ir 2017 m.) po 500 egz. kiekvienas
- Išleista ir platinama brošiūra vaikams apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą (750 egz.)
- Leidžiamas leidinys visuomenei apie projektu sprendžiamas problemas, sprendimo būdus LT ir EN kalbomis (800 egz.).
- Išleistas ir platinamas plakatas apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą (1000 egz.) – paraiškoje nenumatytas, kaštus planuojama padengti iš sutaupytų viešinimo lėšų

E.7 PROJEKTO TECHNINĖS ATASKAITOS PARENGIMAS IR PLATINIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2017 IV	2018 I	Turi būti parengta techninė ataskaita apie projekto patirtį, įgytą diegiant praktines paukščių mirtingumą ant aukštos įtampos elektros linijų mažinančias priemones ir gerinant sakalų perėjimo sąlygas. Ši ataskaita turi būti pateikta gamtosauginėms institucijoms, elektros perdavimo sistemos operatoriams, žiniasklaidai, patalpinta projekto interneto svetainėje.	-

E.8 PROJEKTO “LAYMAN” ATASKAITOS PARENGIMAS IR PLATINIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2018 I	2018 II	Turi būti parengta ir išplatinta populiari projekto ataskaita visuomenei (LT ir EN kalbomis, 700 egz.) apie vykdytą projektą, pasiektus rezultatus ir įgytą patirtį.	-

F. 1 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LOD)

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 II	2018 III	-	- Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27); - Įdarbintas personalas projekto veiklų vykdymui; - Parengta ir pateikta EK projekto pradinė ataskaita (2015-02-28); Turi būti parengtos ir pateiktos: - projekto tarpinė ataskaita; - projekto pažangos ataskaita; - projekto galutinė ataskaita. Turi būti suorganizuoti 5 projekto stebėsenos komiteto posėdžiai.

F. 1 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LOD)

- Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27);
- Įdarbintas personalas projekto veiklų vykdymui (projekto koordinatorė Justina Liaudanskytė, projekto asistentas Liutauras Raudonikis, biologinės įvairovės ekspertas Julius Morkūnas, GIS ekspertė Vita Monkuvienė, svetainės administravimo ekspertas Gintaras Riauba, 2 ornitologai – Marius Karlonas ir Eglė Pakšytė);
- Parengta ir pateikta EK (vėliau EK patvirtinta) projekto įvadinė ataskaita (2015 03 mėn.);
- Parengta ir pateikta EK projekto vidurio pažangos ataskaita (2016 m. 08 mėn.);
- Suorganizuoti 2 projekto stebėsenos komiteto posėdžiai (2015-06-18, 2016-07-14) – III-ias numatomas 2017 m. 06 mėn.

F.2 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LITGRID)

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla vykdoma	2014 III	2018 III	-	- Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27); - Priskirtas personalas projekto veiklų vykdymui.

- **Atlikti viešieji pirkimai C.1-C.4 veiklų įgyvendinimui 2015-2016 m. bei 2017-2018 m.**

F.3 “AFTER-LIFE” KOMUNIKACIJOS PLANO PARENGIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla nepradėta	2018 III	2018 III	Turi būti parengtas After-LIFE komunikacijos planas ir pateiktas su galutine projekto ataskaita.	-

F.4 KOMUNIKAVIMAS SU KITAIS PROJEKTAIS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Atlikta</i>
LOD	Veikla vykdoma	2014 II	2018 III	Su LIFE+ projektus vykdančiomis organizacijomis patirties mainų tikslu suorganizuoti daugiau nei 2 susitikimai.

- 2015-04-15 d. LOD organizavo tarptautinį seminarą su tarptautinių ES šalių projektu „BESTGRID“ apie draugišką aplinkai praktiką plėtojant elektros linijų perdavimo tinklą;
- 2015 m. lapkričio 18 d. du projekto komandos nariai dalyvavo 6-je tarptautinėje konferencijoje „Birds and wires“, kuri vyko Budapešte, Vengrijoje. Konferencijoje skaitytas pranešimas apie vykdomą LIFE projektą Lietuvoje.

F.4 KOMUNIKAVIMAS SU KITAIŠ PROJEKTAIS

▪ Bendradarbiaujama su projektais:

- LIFE-ELIA, Using electricity transmission network routes as active vectors for positive developments in biodiversity, Nr. LIFE10 NAT/BE/709 (www.life-elia.eu);
- Securing prey sources for endangered *Falco cherrug* and *Aquila heliaca* population in the Carpathian basin, Nr. LIFE13 NAT/HU/000183 (www.sakerlife3.mme.hu/hu);
- Energy in the land - power lines and conservation of priority bird species in Natura 2000 sites, Nr. LIFE13 NAT/SK001272 (www.lifeenergia.sk);
- Conservation of *Falco vespertinus* in the Pannonian Region, Nr. LIFE05 NAT/H/000122 (<http://www.kekvercse.mme.hu>);
- BESTGRID, projektą finansuoja ES (www.bestgrid.eu)
- „Baltojo gandro (*Ciconia ciconia*) apsauga Lietuvoje, Nr. LIFE07 NAT/LT/000531 (www.ciconia.lt), projekto partneriais AB ESO (buv. AB LESTO);

F.5 PROJEKTO AUDITAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma	2015 I	2018 III	Sudaryta paslaugų sutartis dėl projekto audito paslaugų. Turi būti atlikti 4 tarpiniai projekto auditai ir galutinis projekto auditas.	-

- 2015 m. 10 mėn. atliktas I-asis tarpinis auditas;
- 2016 m. 10 mėn. atliktas II-asis tarpinis auditas;
- 2017 m. 04 mėn. atliktas III-ias tarpinis auditas;
- 2018 m. 03 mėn. planuojamas IV-asis tarpinis auditas;
- 2018 m. 08 mėn. planuojamas galutinis auditas.
