


**„PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS
LIETUVOS AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS ENERGIJOS
PERDAVIMO TINKLUOSE“**

Nr. LIFE13 BIO/LT/001303
www.birds-electrogrid.lt

Parengė: projekto asistentas L. Raudonikis
projekto koordinatore J. Mažulė (Liaudanskytė)
(šiuo metu nėštumo ir gimdymo atostogose)

2018-12-19, Vilnius



PROJEKTO TERITORIJA: Lietuva, visi regionai

PROJEKTO TRUKMĖ: 2014-06-01 - 2018-07-31, *pratęstas iki 2018-12-31.*

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:


Pagrindinis partneris:
Lietuvos ornitologų draugija;

Susijęs partneris:
AB „LITGRID“

PROJEKTO BIUDŽETAS: ~ 1,5 mln. Eur


PROJEKTĄ FINANSUOJA:

ES – 50%
LR Aplinkos ministerija – 24,34 %
Projekto partneriai – 25,66 %




Projekto tikslai:

- Pagerinti migruojančių, žiemojančių ir kai kurių perinčių paukščių rūšių išsaugojimo sąlygas, sumažinant aukštos įtampos elektros energijos tiekimo linijų keliamą neigiamą poveikį jų populiacijoms;
- Palaikyti pelėsakalių ir kitų sakalų rūšių perinčias populiacijas, įgyvendinant specialias, pagalbines apsaugos priemones.



Projekto uždaviniai:


- Sumažinti paukščių žūčių atvejus jų koncentracijos vietose, kurį lemia paukščių susidūrimas su laidais, virš aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų laidų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
- Sumažinti baltųjų gandrų žūčių lygį dėl elektros įtampos, ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų įrengiant specialias (padidinto matomumo) priemones;
- Sustabdyti sakalų (ypač pelėsakalių (*Falco tinnunculus*)) perėjimo sąlygų blogėjimą ant aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų stulpų Lietuvoje, iškeliant 500 inkilų;
- Įvertinti praktinių apsaugos veiksnių efektyvumą paukščiams, vykdant pritaikytas, išsamias stebėsenos programas;
- Gerinti visuomenės informuotumą apie paukščių žūčių problemą, kurią kelia aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų linijos.



Projektų įgyvendinamos 22 veiklos.

Projekto veiklų struktūra:

- 3 parengiamosios projekto veiklos, kurių rezultatai naudojami įgyvendinant praktines apsaugos veiklas: A.1-A.3;
- 4 praktinės apsaugos veiklos: C.1-C.4;
- 2 projekto veiklų ir poveikio stebėsenos veiklos: D.1-D.2;
- 8 visuomenės informavimo ir informacijos sklaidos veiklos: E.1-E.8;
- 5 projekto administravimo ir plėtros veiklos: F.1-F.5.



A.1 IŠSAMUS LAIDŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ IR PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT NAUDOJAMŲ AUKŠTOS ĮTAMPOS PERDAVIMO TINKLŲ ATRAMŲ LIETUVOJE PARUOŠIMAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2015 I	2014 III	2015 I	A.1 veiklos ataskaita „Laidų ženklavimo ir paukščių apsaugos priemonių parinkimas“	Parengta ataskaita apie parinktas priemones, skirtas laidų ženklavimui ir paukščių apsaugai

Ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžią (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID LOD	Veikla pabaigta 2015 II	2014 III	2015 II	A.2 veiklos ataskaita „Paukščių apsaugos priemonių įgyvendinimo projekto parengimas“	Parengta ataskaita bei sudaryta nacionalinio lygmens aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo segmentų schema apie parinktas baltųjų gandrų apsaugos priemonių diegimo vietas.
Ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje					

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžią (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2015 II	2014 II	2015 II	A.3 veiklos ataskaita „Sakalams skirtų inkilų įrengimo programos parengimas“	Parengta ataskaita ir sudaryta schema, kurioje nustatomos sakalams skirtų inkilų įrengimo vietos Lietuvoje
Ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje					

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 IV	2018 IV	-	Turi būti įrengtos 6464 (iki pakeitimo 7100) „spiralinio“ tipo paukščiams pavojingų aukštos įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo priemonės 92 km (iki pakeitimo 80 km) aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose





Įrengti 6464 vnt. „spiralės“ tipo žymekliai, bendras paženklintų elektros linijų ilgis 93,9 km.



<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 IV	2018 IV	-	Turi būti įrengtos 2890 (iki pakeitimo 1500) „pakabučių“ tipo paukščiams ypatingai pavojingų aukštos įtampos perdavimo linijų vizualizacijos didinimo priemonės 30,8 km (iki pakeitimo 28 km) aukštos įtampos perdavimo linijų atkarpose

Įrengti 2890 vnt. „pakabučių“ tipo žymekliai, bendras paženklintų elektros linijų ilgis 31,2 km.







   					
C.3 PAUKŠČIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ ANT ATRAMŲ ĮRENGIMAS					
Veiklą įgyvendina	Veiklos vykdymo pažanga	Pradžia (aktuali)	Numatyta pabaiga	Pasiekti rezultatai (kūriniai)	Pasiekimai
LITGRID	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 IV	2018 IV	-	Ant mažiausiai 3133 (iki pakeitimo 1200) aukštos įtampos perdavimo linijų atramų turi būti įrengtos lėkštučių 6900 (iki pakeitimo 6000 vnt.) ir šakučių 10800 (iki pakeitimo 6000 vnt.) gandrų apsaugos priemonės.
<p>Įrengtos 11032 „šakutės“ ant 2717 atramų ir 7075 „lėkštelės“ tipo apsaugos ant 2068 atramų.</p>					







<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 IV	2018 IV	-	Pagaminta ir ant aukštos įtampos perdavimo linijų atramų turi būti įrengta 580 (iki pakeitimo 500 vnt.) dirbtinių lizdaviečių/inkilų pelėsakaliams.

Pagaminti ir įrengti 593 vnt. inkilai, iš kurių 13 vnt. buvo įrengti vietoj blogos būklės ar dingusių inkilų.




   					
D.1 PROJEKTO VEIKLŲ STEBĖSENA					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 IV	2018 IV	Turi būti parengtos 5 (iki pakeitimo 4) (kasmetinės) projekto pažangos stebėsenos ataskaitos.	-
<p>I-oji ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2015-06-18 posėdyje ir patalpinta projekto svetainėje; II-oji ataskaita - 2016-07-14 posėdyje; III-oji ataskaita - 2017-11-15 posėdyje; IV-oji ataskaita - 2018-05-29 posėdyje; V-oji ataskaita pristatoma Projekto priežiūros komiteto 2018-12-19 posėdyje.</p>					

   					
D.2 EX-ANTE IR EX-POST PROJEKTO APSAUGOS VEIKLŲ VEIKSMINGUMO STEBĖSENA					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 III	2018 IV	Parengtas Ex-ante ir ex-post stebėsenos planas; Turi būti parengtos 4 (kasmetinės) projekto Ex-ante ir ex-post stebėsenos ataskaitos.	Parengtas Ex-ante ir ex-post stebėsenos planas; Turi būti pasirinkti Ex-ante stebėsenos rodikliai.
<p>I-oji ir II-oji ataskaita patvirtinta Projekto priežiūros komiteto 2016-07-14 posėdyje ir patalpinta projekto svetainėje. III-oji ataskaita - 2017-11-15 posėdyje; IV-oji ataskaita - 2018-12-19 posėdyje.</p>					



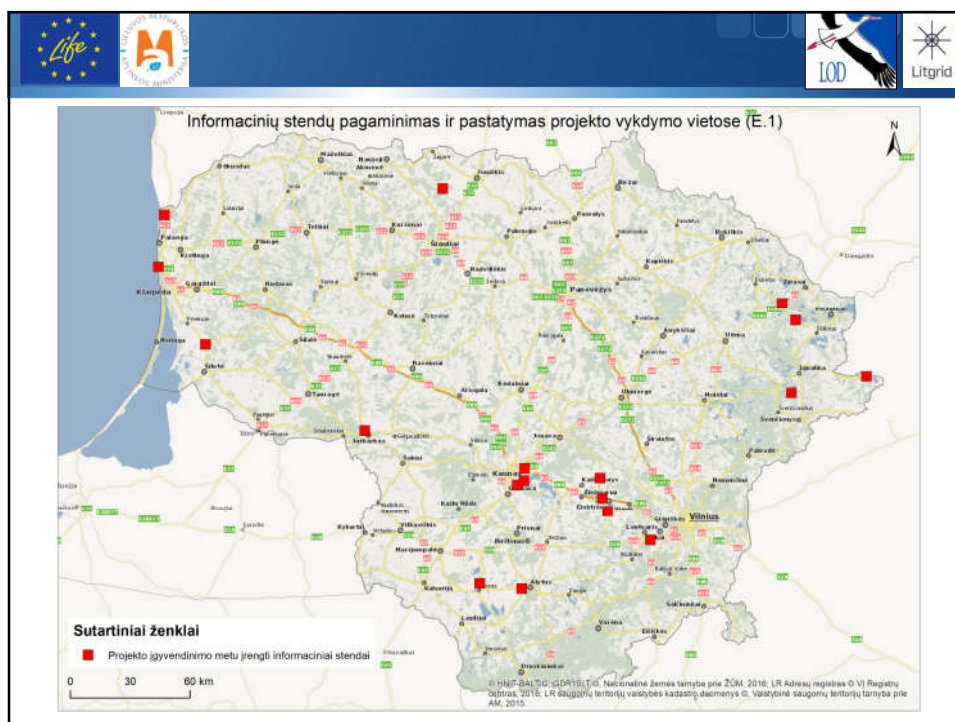

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 II	2015 II	2018 II	Turi būti parengta informacinė medžiaga 18-ai stendų.	Iki 2016-05-31 turi būti įrengti 9 informaciniai stendai; Iki 2018-05-31 turi būti įrengti visi 18 informacinių stendų.





- 2017-04-06 įrengti 9 informaciniai stendai: 2 vnt. – Kaune, 2 vnt. - Elektrėnų sav., Ignalinos r., Švenčionių r., Alytaus r., Kaišiadorių r., Karmėlavos r.
- 2017-12-31 įrengti 6 informaciniai stendai: Palangoje, Zarasų r., Šilutės r., Joniškio r., Jurbarko r., Trakų r.
- 2018-06-29 įrengti 3 informaciniai stendai: Klaipėdos r., Alytaus r., Zarasų r.





<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 I	2015 I	2018 I	Sukurtas 15 min. trukmės filmas LT kalba su EN subtitrais, turi būti išleista ir išplatinta 600 egz. filmo DVD.	Sukurtas filmas turi būti ištransliuotas nacionalinių TV kanalų populiariu laiku mažiausiai 5 kartus.
<p>2016 m. pab. sukurtas filmas „Skirtingų pasaulių sandūroje“ ir pagaminti DVD, kuris transliuotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017-05-13 LRT Kultūra kanalu; - 2017-12-10, 2017-12-25, 2018-02-28, 2018-03-11 INFO TV kanalu. <p>2016, 2017 ir 2018 m. perėjimo laikotarpiais veikė pelėsakalių lizdo tiesioginė transliacija.</p>					


<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 II	2017 III	2018 II	Turi būti parengta ir atspausdinta dalomoji medžiaga seminarui.	Turi būti suorganizuotas vienos dienos tarptautinis seminaras, kurio dalyvių skaičius – apie 50.
<p>2018 m. birželio 28-29 d. įvyko projekto tarptautinis seminaras „Paukščių apsaugos priemonės ir patirtys elektros perdavimo tinkluose“, angl. <i>International seminar “Bird’s protection practices on electricity grids”</i>.</p>					

   					
E.4 PROJEKTO INTERNETO SVETAINĖS SUKŪRIMAS IR PALAIKYMAS					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 III	2018 IV		Sukurta ir nuolat atnaujinama aktualia informacija projekto interneto svetainė: http://www.birds-electrogrid.lt/ .
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Svetainė viešai pasiekama nuo 2014 m. 11 mėn.; ▪ Informacija svetainėje nuolat atnaujinama lietuvių ir anglų k.; ▪ Projekto ataskaitos ir leidiniai talpinami svetainėje; ▪ Projekto svetainės vidutinis lankomumas – 300 apsilankymai/mėn. 					


   					
E.5 PROJEKTO VIEŠINIMAS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Atlikta:</i>	
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 III	2018 III	<ul style="list-style-type: none"> • >40 straipsnių apie projektą publikuoti interneto svetainėje; • 10 straipsnių gamtiniuose žurnaluose; • >10 naujienų LOD Facebook grupėje; • 5 radijo reportažai. • 2 TV reportažai. • 2017 m. kovo 03-05 d. projektas pristatytas tradicinėje „Kaziuko mugėje“ Vilniuje. • 2015, 2016, 2017 ir 2018 m. projektas pristatytas metiniuose LOD narių visuotiniuose susirinkimuose. • 2018 m. rugsėjo 19 d. suorganizuota „Pažintinė išvyka Pietų Lietuvoje ir Žuvinto apylinkėse“, skirta pristatyti projekto praktinių, paukščių apsaugai skirtų veiklų rezultatus, išvykos tikslinė grupė – suinteresuotų institucijų atstovai, tokie kaip AB Litgrid, LR Energetikos ministerijos darbuotojai, spaudos atstovai 	


					
E. 6 PROJEKTO INFORMACINĖS MEDŽIAGOS APIE SPRENDŽIAMĄ PROBLEMĄ PARENGIMAS IR LEIDYBA					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 III	2018 IV	Parengta, išleista ir išplatinta: <ul style="list-style-type: none"> • projekto lankstinukas (1000 egz.); • 5 (kasmetiniai) sieniniai kalendoriai (po 500 egz, kiekvieno); • leidinys-brošiūra vaikams (750 egz.) apie paukščių žuvimo ant aukštos įtampos elektros perdavimo linijų problemą; • leidinys visuomenei apie projektu sprendžiamas problemas, sprendimo būdus LT ir EN kalbomis (800 egz.). 	-

					
E.7 PROJEKTO TECHNINĖS ATASKAITOS PARENGIMAS IR PLATINIMAS					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2017 IV	2018 IV	Turi būti parengta techninė ataskaita apie projekto patirtį, įgytą diegiant praktines paukščių mirtingumą ant aukštos įtampos elektros linijų mažinančias priemones ir gerinant sakalų perėjimo sąlygas. Ši ataskaita turi būti pateikta gamtosauginėms institucijoms, elektros perdavimo sistemos operatoriams, žiniasklaidai, patalpinta projekto interneto svetainėje.	-
Ataskaita parengta ir pateikta derinimui projekto Stebėsenos komiteto nariams.					

					
E.8 PROJEKTO “LAYMAN” ATASKAITOS PARENGIMAS IR PLATINIMAS					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2018 I	2018 IV	Parengta ir išplatinta populiari projekto ataskaita visuomenei (LT ir EN kalbomis, 700 egz.) apie vykdytą projektą, pasiektus rezultatus ir įgytą patirtį.	-


					
F. 1 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LOD)					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 II	2018 IV	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27); • Įdarbintas personalas projekto veiklų vykdymui; • Parengtos ir pateiktos EK projekto ataskaitos: pradinė (2015-02-28); vidurio laikotarpio (2016-08-22); pažangos (2018-02-20). • Projekto galutinė ataskaita bus pateikta EK iki 2019-03-31. <p>Suorganizuoti 5 projekto stebėsenos komiteto posėdžiai.</p>

					
F.2 PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS (LITGRID)					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LITGRID	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 III	2018 IV	-	<ul style="list-style-type: none"> Sudaryta projekto partnerių jungtinės veiklos sutartis (2015-02-27); Priskirtas personalas projekto veiklų vykdymui.

					
F.3 “AFTER-LIFE” KOMUNIKACIJOS PLANO PARENGIMAS					
<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2018 III	2018 IV	Parengtas After-LIFE komunikacijos planas ir pateiktas su galutine projekto ataskaita.	-


<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžią (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Atlikta</i>
LOD	Veikla pabaigta 2018 IV	2014 II	2018 IV	Su LIFE+ projektus vykdančiomis organizacijomis patirties mainų tikslu suorganizuoti daugiau nei 2 susitikimai.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2015-04-15 d. LOD organizavo tarptautinį seminarą su tarptautinių ES šalių projektu „BESTGRID“ apie draugišką aplinkai praktiką plėtojant elektros linijų perdavimo tinklą; ▪ 2015 m. lapkričio 18 d. du projekto komandos nariai dalyvavo 6-je tarptautinėje konferencijoje „Birds and wires“, kuri vyko Budapešte, Vengrijoje. Konferencijoje skaitytas pranešimas apie vykdomą LIFE projektą Lietuvoje. ▪ Projektas buvo pristatytas 2018 m. rugsėjo 19-21 d. vykusiame trečiajame Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikime: 				

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžią (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Atlikta</i>
<p>2017 m. rugsėjo 28-29 d. projektas buvo pristatytas Pernu, Estijoje LIFE partnerystės susitikime “Baltic networking meeting 2017”, kurį organizavo LIFE projektas “Coastal Habitat Conservation in Nature Park ‘Piejūra’, Natura 2000 site“, LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900. Susitikime taip pat buvo pristatyti šie projektai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awareness raising and application quality improvement of the LIFE program in Estonia, AwaRaEst LIFE, No. LIFE 14 CAP/EE/000009; • Building LIFE capacities in Lithuania, LIFE LT, No. LIFE14 CAP/LT/000008; • Capacity Building For LIFE Programme Implementation in Latvia, CAP LIFE LAT, No. LIFE 14 CAP/LV/000002; • Coastal Habitat Conservation in Nature Park ‘Piejūra’, Natura 2000 site, LIFE CoHaBit, LIFE 15NAT/LV/000900; • Assessment of ecosystems and their services for nature biodiversity conservation and management, LIFE EcosystemServices, LIFE13ENV/LV/000839; • Baltic pilot cases on reduction of emissions by substitution of hazardous chemicals and resource efficiency, No. LIFE14ENV/LV000174; • Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services, LIFE GRASSSERVICE, No. LIFE12 BIO/LV/001130; • LIFE to alvars - Restoration of Estonian alvar grasslands, LIFE to alvars, No. LIFE13 NAT/EE/000082; • Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia, LIFE REstore, No. LIFE14 CCM/LV/001103; • Demonstrative restoration of the Tyruļiai bog as a part of the initiative of the re-wetting of Lithuanian peatlands, Tyruļiai–Life, No. LIFE12 NAT/LT/001186 (please note, that LOD is lead beneficiary for this project); • LIFE+ URBANCOWS - Restoration of urban coastal meadow complex in Pärnu town, Estonia, No. LIFE10 NAT/EE/000107; • Integrated planning tool to ensure viability of grasslands, LIFE Viva Grass, No. LIFE13 ENV/LT/000189; • Conservation and Management of priority Wetland habitats in Latvia, LIFE «Wetlands», No. LIFE13 NAT/LV/000578. 				



▪ **Taip pat bendradarbiaujama su projektais:**

- LIFE-ELIA, Using electricity transmission network routes as active vectors for positive developments in biodiversity, Nr. LIFE10 NAT/BE/709 (www.life-elia.eu);
- Securing prey sources for endangered Falco cherrug and Aquila heliaca population in the Carpathian basin, Nr. LIFE13 NAT/HU/000183 (www.sakerlife3.mme.hu/hu);
- Energy in the land - power lines and conservation of priority bird species in Natura 2000 sites, Nr. LIFE13 NAT/SK001272 (www.lifeenergia.sk);
- Conservation of Falco vespertinus in the Pannonian Region, Nr. LIFE05 NAT/H/000122 (<http://www.kekvercse.mme.hu>);
- BESTGRID, projektą finansuoja ES (www.bestgrid.eu)
- „Baltojo gandro (*Ciconia ciconia*) apsauga Lietuvoje, Nr. LIFE07 NAT/LT/000531 (www.ciconia.lt), projekto partneriais AB ESO (buv. AB LESTO);
- "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", Nr. LIFE14 CAP/LT/000008 (<http://lifeprojektai.lt>)
- „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (LIFE IP PAF-NATURALIT), Nr. LIFE16 IPE/LT/016 (<https://naturalit.lt>)



F.5 PROJEKTO AUDITAS

<i>Veiklą įgyvendina</i>	<i>Veiklos vykdymo pažanga</i>	<i>Pradžia (aktuali)</i>	<i>Numatyta pabaiga</i>	<i>Pasiekti rezultatai (kūriniai)</i>	<i>Pasiekimai</i>
LOD	Veikla vykdoma, bus pabaigta 2018 IV	2015 I	2018 IV	Sudaryta paslaugų sutartis dėl projekto audito paslaugų. Turi būti atlikti 4 tarpiniai projekto audita ir galutinis projekto auditas.	-

- 2015 m. 10 mėn. atliktas I-asis tarpinis auditas;
- 2016 m. 10 mėn. atliktas II-asis tarpinis auditas;
- 2017 m. 04 mėn. atliktas III-ias tarpinis auditas;
- 2018 m. 05 mėn. atliktas IV-asis tarpinis auditas;
- Galutinis projekto auditas bus atliktas iki 2018-12-31.
